


新小岩駅重点整備地区、生活関連経路等

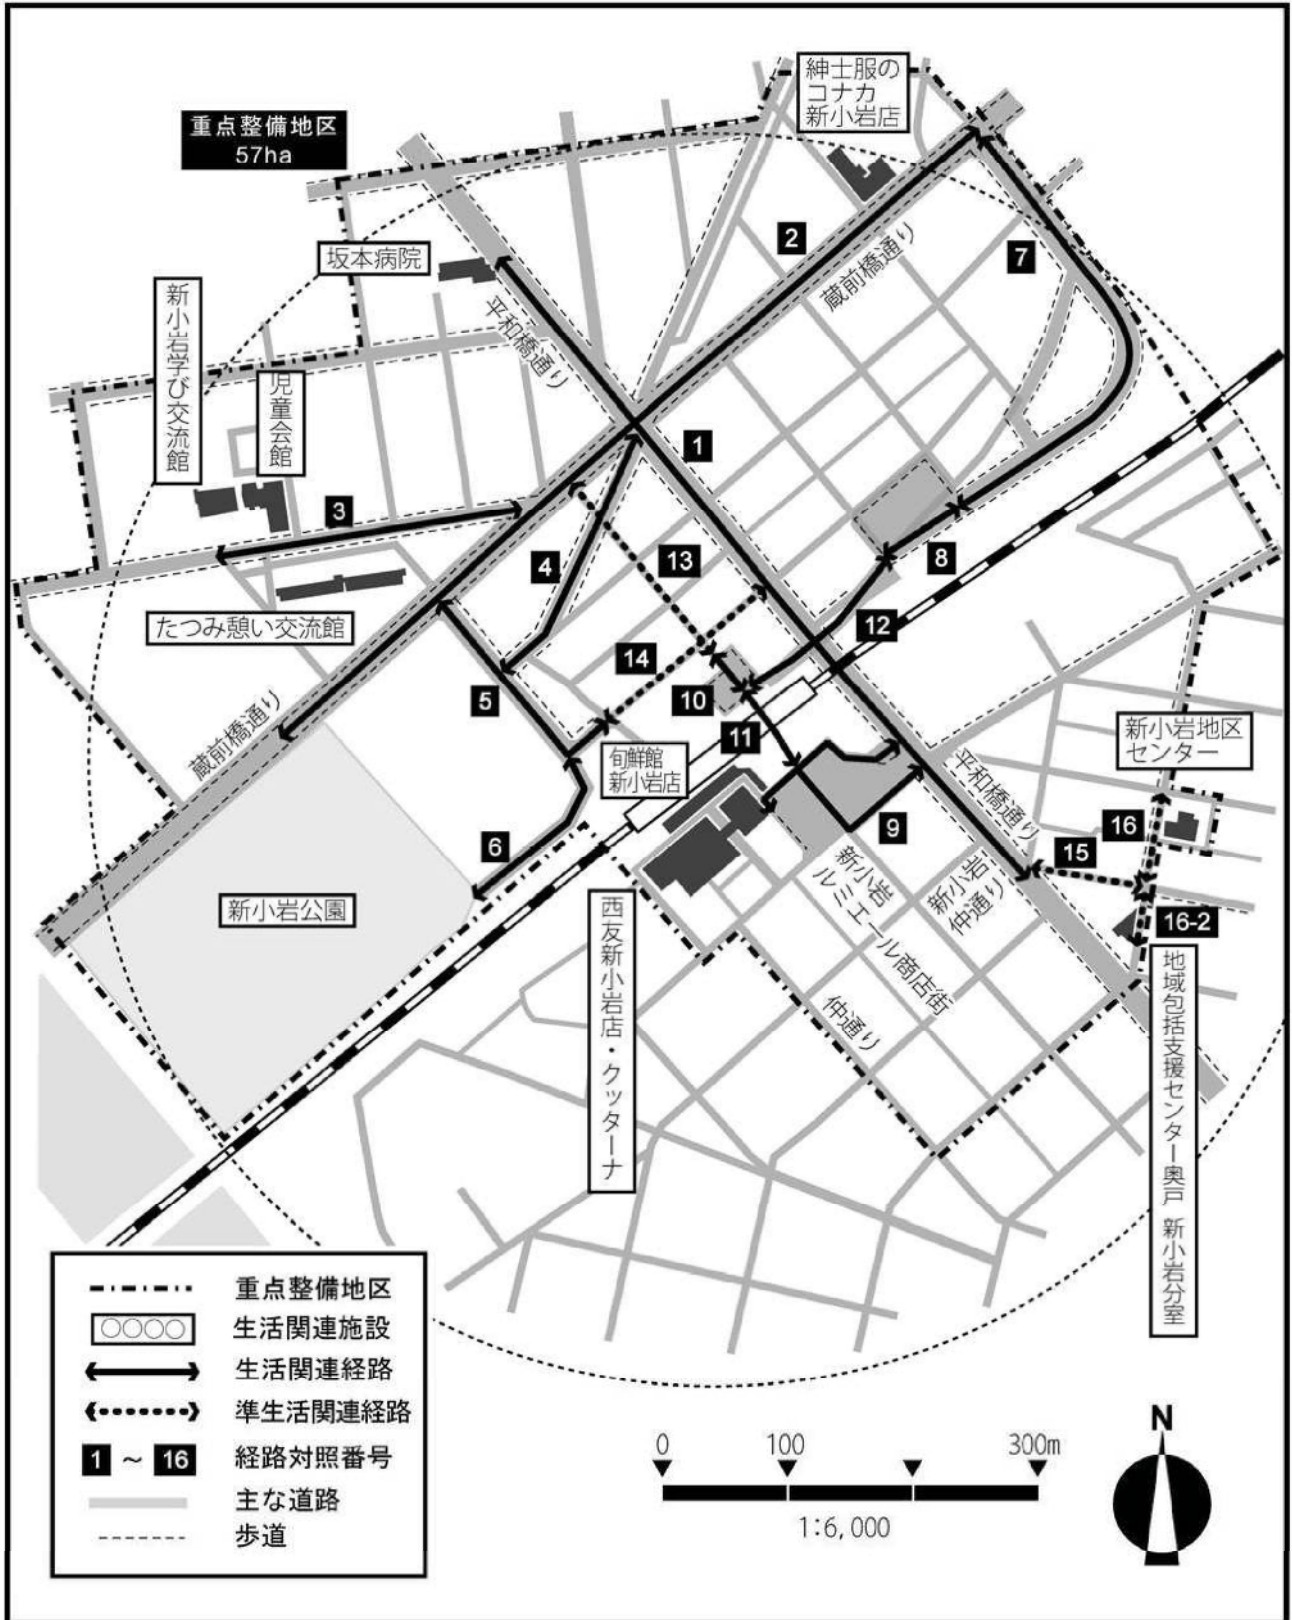

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績					計画		
		H23 以前	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
(1)駅前広場(バス乗車場)へのベンチの設置		■							
(2)ノンステップバスの導入				完了					
(3)接遇向上や機器操作習熟など、乗務員教育研修の実施		継続的に実施							
(4)ヘルプマークの配布及び普及促進				継続的に実施					
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H23 以前	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
1)乗合バス ノンステップバスの導入	低床バス 導入率	100.0%							
2)乗合バス 高齢者・障害者のニーズ把握並びに 接遇・介助技能の習得		継続的に実施							
3)バス乗車場のベンチ設置						1箇所設置			
4)音声案内付バスロケ表示機の整備		2箇所設置							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									
3)平成27年度 巽橋バス停亀有駅方向 4)平成18年度 新小岩駅南口1箇所、平成23年度、新小岩駅東北広場1箇所									

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績					計画		
		H23 以前 完了	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
(1)乗合バス [ノンステップバスの導入]	3両	■							
(2)乗合バス [移動に支障のあるお客様へ適切な対応が図れるよう研修・教育・訓練を全乗務員に実施]		継続的に実施							
(3)ドライブレコーダーの映像を解析し、乗務員指導(危険予知訓練)		継続的に実施							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

道路特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
事業主体:東京都

都道

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績					計画		
		H23 以前	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
(1)経路1 平和橋通り 主308号線 千住小松川葛西沖線 [視覚障害者誘導用ブロックの改善]	640m								
(2)経路1 平和橋通り 主308号線 千住小松川葛西沖線 [電線類の地中化]	400m								
(3)経路1 平和橋通り 主308号線 千住小松川葛西沖線 [新小岩駅前歩道橋の撤去、横断歩道の設置]				完了					
(4)経路2 蔵前橋通り 主315号線 御徒町小岩線 [電線類の地中化]	1,520m	完了							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

道路特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:葛飾区

区道

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H23 以前	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
(1)経路7 補助330号線 区道葛898号 [補助330号線の新設]	412m	完了							
(2)経路8 新小岩東北交通広場 [新小岩東北交通広場の新設]		完了							
(3)経路9 南口駅前広場 [南口駅前広場の暫定整備、再整備]						~H27暫定整備			
(4)経路10 北口広場 [北口広場の整備]									
(5)経路11 新小岩駅南北自由通路 [南北自由通路の整備]	98m								
(6)経路12 新小岩駅北口連絡通路 区道葛937号 [歩行者用連絡通路の新設]	140m	完了							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

道路特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:葛飾区

区道

1. 対象となる特定旅客施設										
JR新小岩駅										
2. 事業内容・実施期間										
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							計画	
		H23 以前	H24	実績		H26	H27	H28	H29	H30 以降
(1)経路15 区道604号 [歩行者ストップマーク・交差点表示の設置]	8箇所			完了						
(2)経路16・16-2 区道589号 [外側線の明確化、歩行者ストップマーク設置]	45m 6箇所			完了						
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項										

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績					計画		
		H23 以前	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
(1)経路1 平和橋通り 主308号線 千住小松川葛西沖線 [音響式信号機、青時間延長信号機等の設置]	3箇所			実施済み					
(2)経路2 蔵前橋通り 主315号線 御徒町小岩線 [音響式信号機、青時間延長信号機等の設置]	3箇所								
(3)経路3 葛9号 [音響式信号機、青時間延長信号機等の設置]	1箇所			実施済み					
(4)経路9 南口駅前広場 [駅前横断歩道へのエスコートゾーン設置]	1箇所	整備済み							
(5)生活関連経路 [違法駐車継続的な取締り強化]		継続的に実施							
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									
(1)経路1 平和橋通り エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。									
(2)経路2 蔵前橋通り エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。									
(3)経路3 エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。									

都市公園特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:葛飾区



1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績				計画			
		H23 以前	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
(1)新小岩公園 [視覚障害者誘導用ブロックの設置、便所の改築、水飲み・出入口の改修]					完了				
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									

建築物特定事業進捗状況(新小岩駅圏)
 事業主体:葛飾区

区施設

1. 対象となる特定旅客施設									
JR新小岩駅									
2. 事業内容・実施期間									
事業内容	延長/ 箇所数	実施期間							
		実績						計画	
		H23 以前 完了	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
(1)新小岩地区センター [だれでもトイレの設備改修]									
3. その他事業実施に際し配慮すべき事項									
